

한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 WBS 및 마일스톤

문서번호	HB-2026-WBS-001
사업명	한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 구축
작성일	2026년 8월 30일
상위 문서	HB-2026-SOW-001 과업지시서 제7장

1. 산정 기준

- 공수는 개발자 1인의 순수 작업 시간(인시)으로 적는다. 회의·보고·대기 시간은 제외한다.
- 1인월은 160인시로 환산한다.
- 일정은 착수일과 종료일을 모두 포함한다.
- 2026년 11월 11일부터 20일까지는 발주사 대형 판촉 기간으로 운영 반영을 하지 않는다. 해당 기간에도 개발은 계속하나 배포가 필요한 작업은 일정에서 뺐다.

2. 과업별 공수·일정·선후행

WBS	과업	공수(인시)	시작	종료	선행 과업	우선순위
W-01	주문 도메인 재설계 및 상태기계 구현	320	2026-09-22	2026-11-07	없음	최상
W-02	정산 엔진 신규 개발	520	2026-10-05	2026-12-24	W-01 설계 완료	최상
W-03	결제대행(PG) 이중화 및 장애 자동 전환	미정	2026-11-02	2026-12-11	없음	상
W-04	재고 동기화 이벤트 기반 전환	260	2026-10-19	2026-12-04	없음	중
W-05	판매자 정산 포털 신규 구축	300	2026-11-09	2027-01-22	W-02	상
W-06	레거시 데이터 이관 및 검증	200	2026-12-07	2027-01-16	W-01, W-02	
W-07	관측성 체계 구축	160	2026-09-22	2026-10-30	없음	중
W-08	통합 성능시험 및 안정화	240	2027-01-19	2027-02-20	W-01 ~ W-07 전건	최상

W-03의 공수는 아직 산정하지 못했다. 2차 PG(이스트페이)의 연동 규격서를 아직 받지 못해 어댑터 개발 범위를 확정할 수 없다. 규격서 수령 후 2주 이내에 산정하여 본 문서를 개정한다. 시작·종료일은 PG 사 시험 환경 이용 가능일(화요일 야간)을 역산해 잡은 값이다.

W-06의 우선순위는 이번 개정에서 정하지 못했다. 재무팀은 개통 전 이관을, 개발팀은 개통 후 순차 이관을 주장하고 있어 M1 설계 검토 회의의 결정을 기다린다.

과업별 일정 (W-01 ~ W-08)

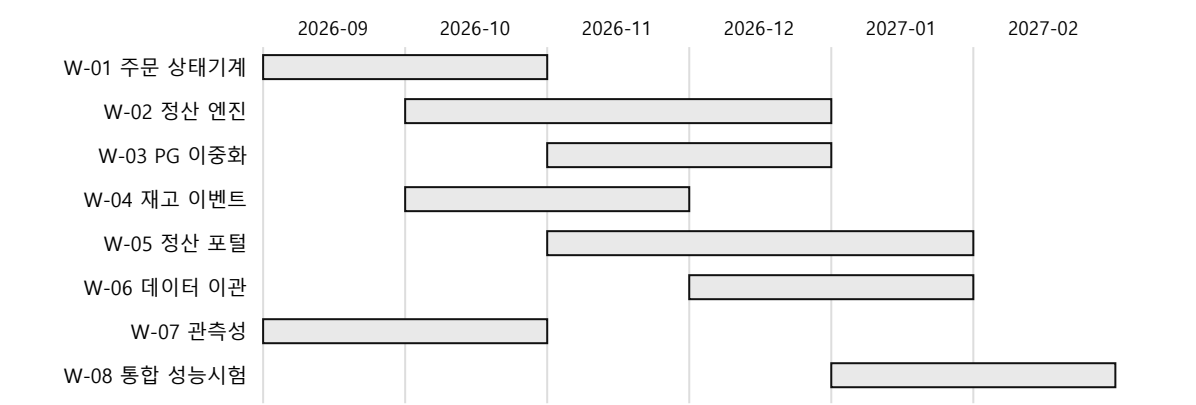


그림 1 과업별 일정 (W-01 ~ W-08)

3. 과업별 상세 작업

3.1 W-01 주문 도메인 재설계 및 상태기계 구현 (320인시)

작업	공수	기간
현행 상태값 조사 및 매핑 정의	48	09-22 ~ 09-30
상태 정의서 및 전이 규칙표 작성	56	10-01 ~ 10-13
상태 전이 엔진 구현	120	10-14 ~ 10-30
주문 서비스 연동 및 낙관적 잠금	96	10-26 ~ 11-07

3.2 W-02 정산 엔진 신규 개발 (520인시)

작업	공수	기간
정산 계산 규칙 정의	64	10-05 ~ 10-16
단계별 계산기 구현 (5단계)	200	10-19 ~ 11-27
일 정산 배치 및 월 마감 처리	120	11-23 ~ 12-11
정산 원장 및 조정 처리	80	12-07 ~ 12-18
재무팀 대사 검증 도구	56	12-14 ~ 12-24

3.3 W-04 재고 동기화 이벤트 기반 전환 (260인시)

작업	공수	기간
이벤트 스키마 정의 및 토픽 설계	40	10-19 ~ 10-27
발행·구독 구현	100	10-28 ~ 11-19
WMS 연계 어댑터	80	11-16 ~ 11-30
보정 배치	40	11-30 ~ 12-04

3.4 W-05 판매자 정산 포털 신규 구축 (300인시)

작업	공수	기간
화면 설계 및 디자인 시스템 구성	60	11-09 ~ 11-27
로그인 및 권한 분리	40	11-30 ~ 12-09
정산서 목록·상세 및 근거 펼침	100	12-10 ~ 01-08
이의 제기 접수·추적	60	01-05 ~ 01-15
내려받기 및 접근성 대응	40	01-14 ~ 01-22

3.5 W-06 레거시 데이터 이관 및 검증 (200인시)

작업	공수	기간
이관 매핑 정의서 작성	40	12-07 ~ 12-15
이관 파이프라인 구현	80	12-16 ~ 01-06
시험 이관 3회 및 검증 리포트	80	01-05 ~ 01-16

3.6 W-07 관측성 체계 구축 (160인시)

작업	공수	기간
구조화 로그 표준 정의 및 적용	56	09-22 ~ 10-06
지표 수집 및 대시보드 3종	56	10-07 ~ 10-20
분산추적 계측	32	10-19 ~ 10-27
경보 규칙 정의	16	10-28 ~ 10-30

3.7 W-08 통합 성능시험 및 안정화 (240인시)

작업	공수	기간
시나리오 설계 및 부하 환경 구성	48	01-19 ~ 01-27
성능시험 3회 및 병목 개선	96	01-28 ~ 02-10
장애 주입 시험	48	02-09 ~ 02-13
운영 이관 및 안정화 지원	48	02-16 ~ 02-20

4. 마일스톤

구 분	명칭	일자	충족 조건
M0	착수보고	2026-09-14	수행 계획서 승인
M1	설계 완료	2026-10-30	아키텍처·상태전이·DB·화면 설계서 승인, 관측성 완료 기준 확정, W-06 우선순위 확정
M2	정산 엔진 1차 개통	2026-12-24	일 정산 배치 가동, 재무팀 대사 차액 0원
M3	통합시험 착수	2027-01-19	W-01 ~ W-07 개발 완료
M4	운영 개통	2027-02-01	비기능 요구사항 전건 충족, 결함 등급 상 0건
M5	안정화 종료	2027-02-27	개통 후 4주 무중대장애, 최종 검수 완료

5. 임계 경로

W-01 → W-02 → W-05 → W-08이 임계 경로다. 총 여유 기간은 9영업일뿐이며, 특히 W-02의 단계별 계산기 구현(200인시)이 지연되면 W-05 착수가 밀려 M4를 지킬 수 없다. W-03과 W-04, W-07은 임계 경로 밖이라 각각 15일, 12일, 21일의 여유가 있다.
