

하나로유통 김천 물류센터 WMS WBS 및 일정

문서번호	HN-2026-WBS-007
작성일	2026년 10월 2일
상위 문서	HN-2026-SOW-007 과업지시서 제3장

1. 산정 기준

- 공수는 개발자 1인의 순수 작업 시간(인시)이다.
- 1인월은 160인시로 환산한다.
- 성수기인 2026년 12월 8일부터 24일까지는 일정에서 제외했다.

2. 과업별 공수·일정

WBS	과업	공수(인시)	시작	종료	선행	우선순위
H-01	입고-검품 프로세스 재구축	280	2026-10-12	2026-11-27	없음	상
H-02	로케이션 체계 재설계	360	2026-10-12	2026-12-18	없음	최상
H-03	피킹 최적화 (DAS/DPS)	440	2026-11-16	2027-01-29	H-02	최상
H-04	순환 실사 도입	240	2027-01-04	2027-02-19	H-02	중
H-05	자동창고 연계 표준화	300	2026-11-02	2027-01-15	없음	상
H-06	데이터 이관	220	2027-02-01	2027-03-19	H-01, H-02	상
H-07	통합·부하 시험 및 안정화	320	2027-03-08	2027-04-30	H-01 ~ H-06	최상

과업별 일정 (H-01 ~ H-07)

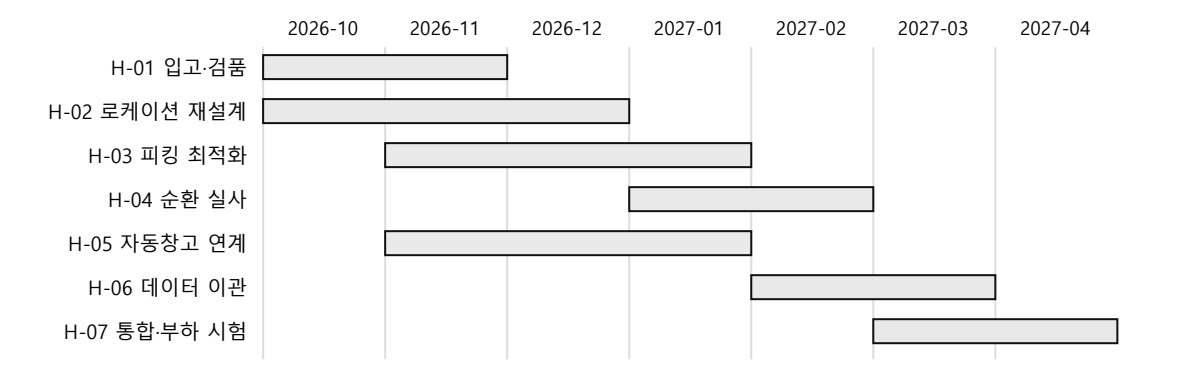


그림 1 과업별 일정 (H-01 ~ H-07)

3. 마일스톤

구분	명칭	일자	충족 조건
K0	착수보고	2026-10-05	수행 계획서 승인
K1	설계 완료	2026-12-18	로케이션 배치 설계서 승인
K2	피킹 시범 가동	2027-01-29	1개 구역에서 오류율 0.05% 이하
K3	전 구역 전환	2027-03-19	이관 검증 리포트 승인
K4	안정화 종료	2027-04-30	4주 무중대장애

4. 임계 경로

H-02 에서 H-03 을 거쳐 H-07 로 이어지는 사슬이 임계 경로다. 로케이션 재설계가 늦어지면 피킹 최적화의 시뮬레이션 전제가 무너져 전체가 밀린다. 총 여유는 12명업일이다.
