

아라찬넷 주문 모듈 리팩터링 추진 계획

왜 지금인가

주문 모듈은 한 클래스가 4,100줄이다. 최근 6개월 동안 이 모듈에서 나온 결함이 전체의 41% 였고, 결함 하나를 고치는 데 드는 시간이 다른 모듈의 2.3배다. 4분기에 예약 주문 기능이 들어오는데, 지금 구조로는 그 기능을 엮을 자리가 없다.

하지 않을 것

- 동작을 바꾸지 않는다. 이번 작업에 기능 추가는 없다.
- 전면 재작성을 하지 않는다. 옆에 새로 짓고 갈아타는 방식은 검토했으나 이관 기간 동안 두 벌을 유지해야 해서 접었다.
- 데이터 모델을 건드리지 않는다. 스키마 변경은 별도 과업으로 뺀다.

순서

단계	내용	기간	검증
1	현재 동작을 고정하는 특성화 시험 작성	2주	주요 경로 46개 시나리오 통과
2	주문 생성 경로 분리	3주	1단계 시험 전건 통과
3	주문 변경·취소 경로 분리	3주	1단계 시험 전건 통과
4	정산 연계 부분 인터페이스 정리	2주	연계 시험 통과
5	죽은 코드 제거 및 정리	1주	커버리지 하락 없음

단계별 추진 일정

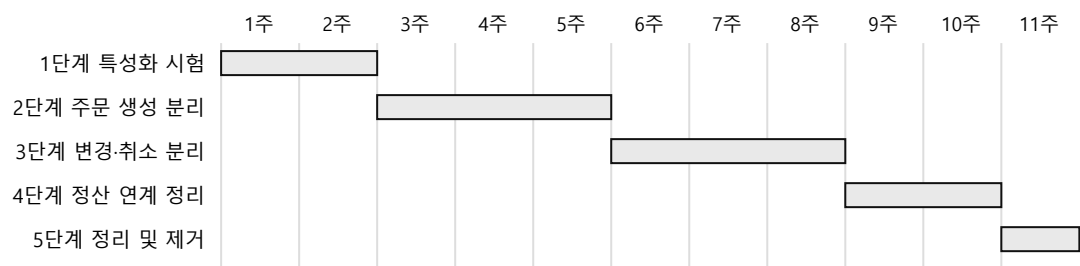


그림 1 리팩터링 5단계 추진 일정

위험

위험	대응
1단계 시험이 현재 동작을 다 못 덮는다	운영 로그로 실제 호출 조합을 뽑아 시나리오를 보강한다
작업 중 결함 수정이 들어와 충돌한다	긴급 수정은 기존 코드에 하고, 리팩터링 브랜치에 매주 되접는다
일정이 4분기 개발과 겹친다	4단계까지를 10월 2주차 마감으로 두고, 5단계는 뒤로 미룬다

끝났다고 보는 기준

가장 큰 클래스가 600줄 이하가 되고, 주문 모듈 결함 비중이 두 분기 연속 25% 아래로 떨어지면 끝난 것으로 본다. 두 번째 기준은 시간이 걸리므로 1분기 뒤에 다시 잴다.
