

한빛리테일 사내 그룹웨어 유지보수 용역 과업지시서

문서번호	HB-2026-SOW-014
발주사	주식회사 한빛리테일 (경영지원본부 정보전략팀)
사업명	2027년도 사내 그룹웨어 유지보수 용역
작성일	2026년 8월 20일
개정	v1.1 (2026-08-27, 과업 3.5·3.6 추가)
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본
비고	본 사업은 주문·정산 시스템 고도화 구축 사업과 별개다.

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

사내 그룹웨어(전자결재·근태·게시판·메일)는 2019년 도입 이후 임직원 1,840명이 매일 쓰는 업무 기반이다. 2026년에는 중대 장애 2건과 경미 장애 31건이 발생했고, 개선 요청은 147건이 접수되어 89건만 처리되었다. 미처리 58건의 대부분은 월 40인시 한도를 넘어 다음 해로 밀린 것이다.

또한 2027년 1월 시행되는 연차 사용 촉진 절차 개정을 반영하지 않으면 근태 집계가 법 기준과 어긋난다. 2027년도 유지보수는 이 두 가지 — 안정적인 장애 대응과 밀린 개선·법규 반영 — 를 함께 감당해야 한다.

1.2 사업 목적

- 등급별 대응 시간을 지켜 업무 중단 시간을 줄인다.
- 법규 개정 사항을 시행일 전에 반영한다.
- 이월된 개선 요청을 한도 안에서 순차 처리한다.
- 2028년 제품 지원 종료에 대비해 전환 방향을 미리 정한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2027년 1월 1일 ~ 2027년 12월 31일 (12개월)
총 사업비	금 일억이천만원정 (₩120,000,000, 부가세 별도)
대금 지급	월 균등 분할 (매월 말일 기성)
대상 사용자	임직원 1,840명
수행 형태	원격 유지보수, 월 2회 정기 방문

2. 현행 시스템 현황

구분	내용	비고
플랫폼	상용 그룹웨어 G-Office 4.2	2019년 도입, 2028년 지원 종료 예정
서버	사내 IDC 물리 서버 4대 (WAS 2, DB 1, 파일 1)	가상화 없음
DB	MS SQL Server 2016	연장 지원 2027년 7월 종료
연동	인사시스템(일 1회 배치), 사내 메신저(SSO)	인사시스템은 타 사업자 담당
백업	일 1회 전체 백업, 테이프 보관 4주	복구 훈련 미실시
장애 이력	2026년 중대 2건, 경미 31건	중대 2건 모두 DB 잠금 경합

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 수행해야 할 과업을 정한다. 서비스 수준과 그 측정 방법은 별첨 「서비스 수준 부속합의서」를, 2027년에 반영할 개선 요청의 목록과 공수는 별첨 「2026년 개선 요청 접수 내역 및 2027년 반영 계획」을 따른다.

3.1 장애 대응

장애 접수부터 복구까지를 담당한다. 등급 판정은 발주사 정보전략팀이 하고, 수행사는 판정된 등급에 따라 아래 시간 안에 착수·복구한다.

등급	정의	접수 후 착수	복구 목표
1등급	전사 사용 불가	15분 이내	2시간 이내
2등급	일부 기능 사용 불가	1시간 이내	8시간 이내
3등급	불편하나 사용 가능	1영업일 이내	5영업일 이내

- 장애 접수 창구를 단일화하고 접수·착수·복구 시각을 기록한다.
- 중대 장애는 복구 후 5영업일 이내에 원인 분석서를 제출한다.
- 2026년 중대 장애 2건의 원인인 DB 잠금 경합에 대한 재발 방지책을 1분기 안에 적용한다.

장애 접수부터 복구까지의 처리 절차 (과업 3.1)




그림 1 장애 접수부터 복구까지의 처리 절차 (과업 3.1)

3.2 법규 변경 반영

근로기준법·전자문서법 개정에 따른 전자결재 보존 기간과 근태 집계 규칙 변경을 반영한다. 시행일 전에 반영을 마치는 것이 이 과업의 성립 조건이다.

- 연차 사용 촉진 절차 변경 반영 (2027년 1월 시행)
- 전자결재 문서 보존 기간 규정 반영
- 반영 전후 근태 집계 결과 비교 검증

3.3 경미 개선

월 40인시 한도 안에서 화면·양식·권한 관련 경미 개선을 수행한다. 2026년에서 이월된 58건과 2027년 신규 접수분을 함께 처리한다. 40인시를 초과하는 요청은 별도 계약으로 처리하며, 초과가 예상되면 사전에 통보한다.

- 이월 58건 중 우선 반영 4건(I-2027-01 ~ I-2027-04)을 상반기에 처리한다.
- 나머지는 접수 순서대로 한도 안에서 처리한다.
- 개선 요청 접수·처리 현황을 월간 실적 보고서에 집계한다.

3.4 정기 점검 및 예방 조치

장애가 나기 전에 잡는 것이 이 과업의 목적이다.

- 월 1회 서버 자원·백업 상태·보안 패치 점검 및 체크리스트 제출
- 분기 1회 성능 점검 및 튜닝 제안 (쿼리 응답 시간, 잠금 경합 현황 포함)
- 보안 취약점 점검 결과에 따른 패치 적용 (긴급 패치는 1영업일 이내)

3.5 백업 및 재해 복구 훈련 지원

현행 백업은 수행되고 있으나 복구를 실제로 해 본 적이 없다. 백업본으로 정말 복구가 되는지를 연 1회 훈련으로 확인한다.

- 복구 절차서 작성 및 현행화
- 연 1회 복구 훈련 수행 (별도 환경에 전체 복구, 목표 복구 시간 4시간)
- 훈련 결과 보고 및 절차 보완

3.6 상위 버전 전환 사전 검토

G-Office 4.2는 2028년, MS SQL Server 2016은 2027년 7월에 지원이 끝난다. 전환 사업을 2028년에 하려면 2027년 안에 방향이 정해져 있어야 한다. 본 과업은 전환 자체가 아니라 검토와 제안까지다.

- 상위 버전 및 대체 제품 비교 검토
- 현행 커스터마이징 항목의 이식 가능 여부 조사
- 전환 방식·기간·개략 비용을 담은 제안서 제출 (2027년 10월)

4. 요구사항 개요

구분	요구사항	근거
대응 시간	등급별 착수·복구 시간을 지킨다	SLA 부속합의서 3장
가용성	계획 정지를 제외한 월 가용성 99.5% 이상	SLA 부속합의서 3장
개선 처리	경미 개선 접수 후 10영업일 이내 처리 80%	SLA 부속합의서 3장
점검	정기 점검 수행률 100%	SLA 부속합의서 3장
법규	개정 시행일 전 반영 완료	본 문서 3.2
복구	재해 복구 훈련 목표 복구 시간 4시간	본 문서 3.5

5. 산출물 및 검수 기준

주기	산출물	검수 기준
월간	유지보수 실적 보고서, 장애 처리 내역서, 점검 체크리스트	등급별 대응 시간 준수율 95% 이상, 점검 항목 전건 수행
수시	중대 장애 원인 분석서	복구 후 5영업일 이내 제출
분기	성능 점검 결과서 및 튜닝 제안서	점검 항목 전건 수행
연 1회	복구 절차서, 재해 복구 훈련 결과 보고서	목표 복구 시간 4시간 이내 달성
2027-10	상위 버전 전환 검토 제안서	정보전략팀 검토 회의 승인
연간	연간 운영 보고서, 개선 제안서	발주사 정보전략팀 승인

6. 수행 체계 및 투입 인력

역할	인원	등급	투입률	필수 기술	담당 과업
유지보수 총괄	1	고급	30%	그룹웨어 운영 3년 이상, 서비스 수준 관리	3.1(1등급), 3.6
애플리케이션 담당	1	중급	100%	Java 8, JSP, G-Office 커스터마이징	3.1, 3.2, 3.3
DB·인프라 담당	1	중급	50%	MS SQL Server, Windows Server, 백업·복구	3.4, 3.5

연간 총 투입 규모는 21.6 M/M이며 월 평균 1.8 M/M이다. 인사시스템 연동 규격이 바뀌는 경우 애플리케이션 담당이 대응하되, 규격 협의는 유지보수 총괄이 맡는다.

7. 일정 및 공수 배분

과업	연간 계획 공수	수행 시기
3.1 장애 대응	1,080인시	상시 (연중)
3.2 법규 변경 반영	240인시	1분기 집중, 이후 수시
3.3 경미 개선	480인시	상시 (월 40인시 한도)
3.4 정기 점검 및 예방 조치	360인시	월 1회 · 분기 1회
3.5 백업 및 재해 복구 훈련 지원	80인시	2027년 3분기
3.6 상위 버전 전환 사전 검토	미정	2027년 3~4분기

배분표 합계는 2,240인시이며, 총 투입(21.6 M/M)과의 차이는 상시 대기·인수인계·문서화·교육에 쓴다. 3.6의 공수는 검토 대상 제품이 몇 개가 될지 정해지지 않아 산정하지 못했다. 2027년 2분기 정보전략팀 협의에서 대상을 확정된 뒤 산정한다.

과업별 연간 계획 공수

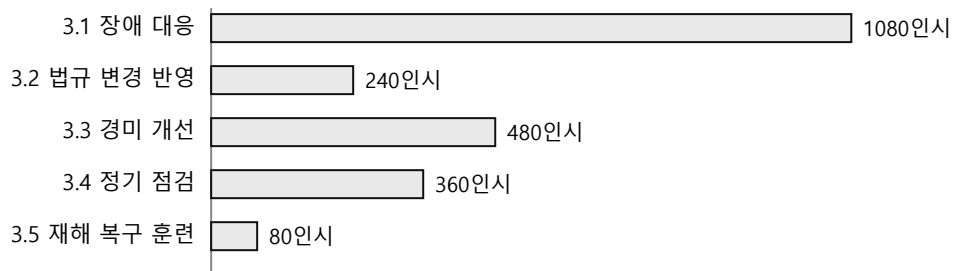


그림 2 과업별 연간 계획 공수 (합계 2,240인시, 과업 3.6 제외)

7.1 분기 마일스톤

시기	내용
2027-01	연차 사용 촉진 절차 개정 반영 완료 (시행일 전)
2027-03	DB 잠금 경합 재발 방지책 적용 완료
2027-06	우선 반영 개선 4건 처리 완료
2027-09	재해 복구 훈련 실시 및 결과 보고
2027-10	상위 버전 전환 검토 제안서 제출
2027-12	연간 운영 보고 및 최종 검수

8. 제약사항

- 운영 서버 작업은 업무 외 시간(19시 이후) 또는 주말에만 수행한다.
- 계획 정지는 월 1회, 매월 셋째 주 토요일 22시부터 4시간 이내로 한다.
- 성능시험이 필요한 경우 발주사 공용 성능시험 환경 1식을 예약하여 사용한다. 2027년 1월 중 예약을 계획하고 있다.
- G-Office 상용 라이선스 범위를 벗어나는 소스 수정은 할 수 없다.
- 인사시스템 연동 규격 변경은 인사시스템 담당 사업자와 협의 후 반영한다.
- 임직원 개인정보가 포함된 데이터는 사내망 밖으로 반출할 수 없다.

9. 위험 관리

ID	대상 과업	위험	영향	대응
G-R-01	3.6	G-Office 4.2가 2028년 지원 종료 예정이다.	보안 패치 중단	2027년 10월까지 전환 검토 제안서 제출
G-R-02	3.4	MS SQL Server 2016 연장 지원이 2027년 7월 종료된다.	보안 취약	2027년 상반기 중 업그 레이드 계획 수립
G-R-03	3.3	경미 개선 요청이 월 40인시를 상시 초과한다.	계약 범위 분쟁	접수 창구 단일화, 초과 분 사전 통보
G-R-04	3.5	복구를 한 번도 해 본 적이 없어 백 업본이 쓸 수 있는 것인지 모른다.	실제 재해 시 복구 실 패	3분기 훈련을 별도 환경 에서 전체 복구로 수행

10. 사업관리 요구사항

아래 항목은 사업을 관리하기 위한 절차이며, 과업(제3장)과 구분한다.

- 월간 보고회를 매월 첫째 주에 개최한다.
- 투입 인력 교체 시 발주사에 사전 통보한다.
- 투입 인력 전원은 보안서약서를 제출한다.
- 하자보수는 유지보수 계약에 포함되므로 별도로 적용하지 않는다.
